

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA

1. Informações Gerais do Projeto

Cliente:	MOTAENGIL BRASIL
Nome do Projeto:	INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA
Responsável Técnico:	Everton Narciso
Data de Execução:	31/08/2026

2. Rastreabilidade do Equipamento de Teste

Fabricante / Modelo:	EXFO / MAX-720C-SM1-EA
Número de Série:	1117199
Data da Última Calibração:	31/08/2026

3. Parâmetros de Teste e Configuração

Tipo de Fibra:	☒ Monomodo (SM) ☐ Multimodo (MM) (OM3/OM4/OM5)
Norma de Referência:	☐ ANSI/TIA-568 ☐ ISO/IEC 11801 ☐ Outra:
Comprimento de Onda:	☐ 850 nm ☐ 1300 nm ☒ 1310 nm ☐ 1550 nm
Tier de Certificação:	☐ Tier 1 (LSPM) ☒ Tier 2 (OTDR)


4. Tabela de Resultados das Medições Produção

ID Fibra	Origem / Destino	Comp. (m)	Perda Medida (dB)	Limite Norma (dB)	Margem (dB)	Status
01	CPD/ R10B5_ME	435,7	1,18	3,17	1,99	OK
02	CPD / R10B5_ME	435,7	0,76	3,17	2,41	OK
03	CPD / R9B4_ME	303,1	1,77	3,17	1,4	OK
04	CPD / R9B4_ME	303,1	2,91	3,17	0,26	OK
05	CPD / R8B3_ME	311	0,82	3,17	2,35	OK
06	CPD / R8B3_ME	311	0,61	3,17	2,56	OK
07	CPD / R8B3_ME	310,9	1,26	3,17	1,91	OK
08	CPD / R8B3_PT	311	1,05	3,17	2,12	OK
09	CPD / R7B3_ME	301,9	1,13	3,17	2,04	OK
10	CPD / R7B3_ME	301,9	1,26	3,17	1,91	OK
11	CPD / R6B3_ME	282,1	1,48	3,17	1,69	OK
12	CPD / R6B3_ME	282,1	0,64	3,17	2,53	OK
13	CPD/ R6B3_PT	282,2	0,63	3,17	2,54	OK
14	CPD / R6B3_PT	282,2	0,71	3,17	2,46	OK
15	CPD / R3B2_ME	149,5	0,65	2,87	2,22	OK
16	CPD / R3B2_ME	149,5	1,97	2,87	0,9	OK
17	CPD / R5B2A_ME	187,8	0,52	2,87	2,35	OK
18	CPD / R5B2A_ME	187,8	0,42	2,87	2,45	OK
19	CPD / R5B2A_PT	187,7	0,42	2,87	2,45	OK
20	CPD / R5B2A_PT	187,7	0,49	2,87	2,38	OK
21	CPD / R4B2_ME	180,6	0,37	2,87	2,5	OK
22	CPD / R4B2_ME	180,6	0,67	2,87	2,2	OK
23	B1_CFTV	39,8	0,48	2,1	1,62	OK
24	B1_CFTV	39,8	0,36	2,1	1,74	OK

5.Tabela de Resultados das Medições Redundância

ID Fibra	Origem / Destino	Comp. (m)	Perda Medida (dB)	Limite Norma (dB)	Margem (dB)	Status
01	CPD/ R10B5_ME	435,1	0,57	3,17	2,6	OK
02	CPD / R10B5_ME	435,1	1,68	3,17	1,49	OK
03	CPD / R9B4_ME	302,2	0,6	3,17	2,57	OK
04	CPD / R9B4_ME	302,2	0,32	3,17	2,85	OK
05	CPD / R8B3_ME	310,3	0,73	3,17	2,44	OK
06	CPD / R8B3_ME	310,3	1,4	3,17	1,77	OK
07	CPD / R8B3_ME	309,8	0,34	3,17	2,83	OK
08	CPD / R8B3_PT	309,9	2,3	3,17	0,87	OK
09	CPD / R7B3_ME	300,06	0,81	3,17	2,36	OK
10	CPD / R7B3_ME	300,06	2,17	3,17	1	OK
11	CPD / R6B3_ME	280,7	1,55	3,17	1,62	OK
12	CPD / R6B3_ME	280,7	0,64	3,17	2,53	OK
13	CPD/ R6B3_PT	281,1	0,36	3,17	2,81	OK
14	CPD / R6B3_PT	281,1	0,55	3,17	2,62	OK
15	CPD / R3B2_ME	149,3	0,50	2,87	2,37	OK
16	CPD / R3B2_ME	149,3	0,51	2,87	2,36	OK
17	CPD / R5B2A_ME	187,7	0,88	2,87	1,99	OK
18	CPD / R5B2A_ME	187,7	1,48	2,87	1,39	OK
19	CPD / R5B2A_PT	187,2	0,48	2,87	2,39	OK
20	CPD / R5B2A_PT	187,2	0,51	2,87	2,36	OK
21	CPD / R4B2_ME	181,3	0,9	2,87	1,97	OK
22	CPD / R4B2_ME	181,3	0,51	2,87	2,36	OK

6. Topologia:

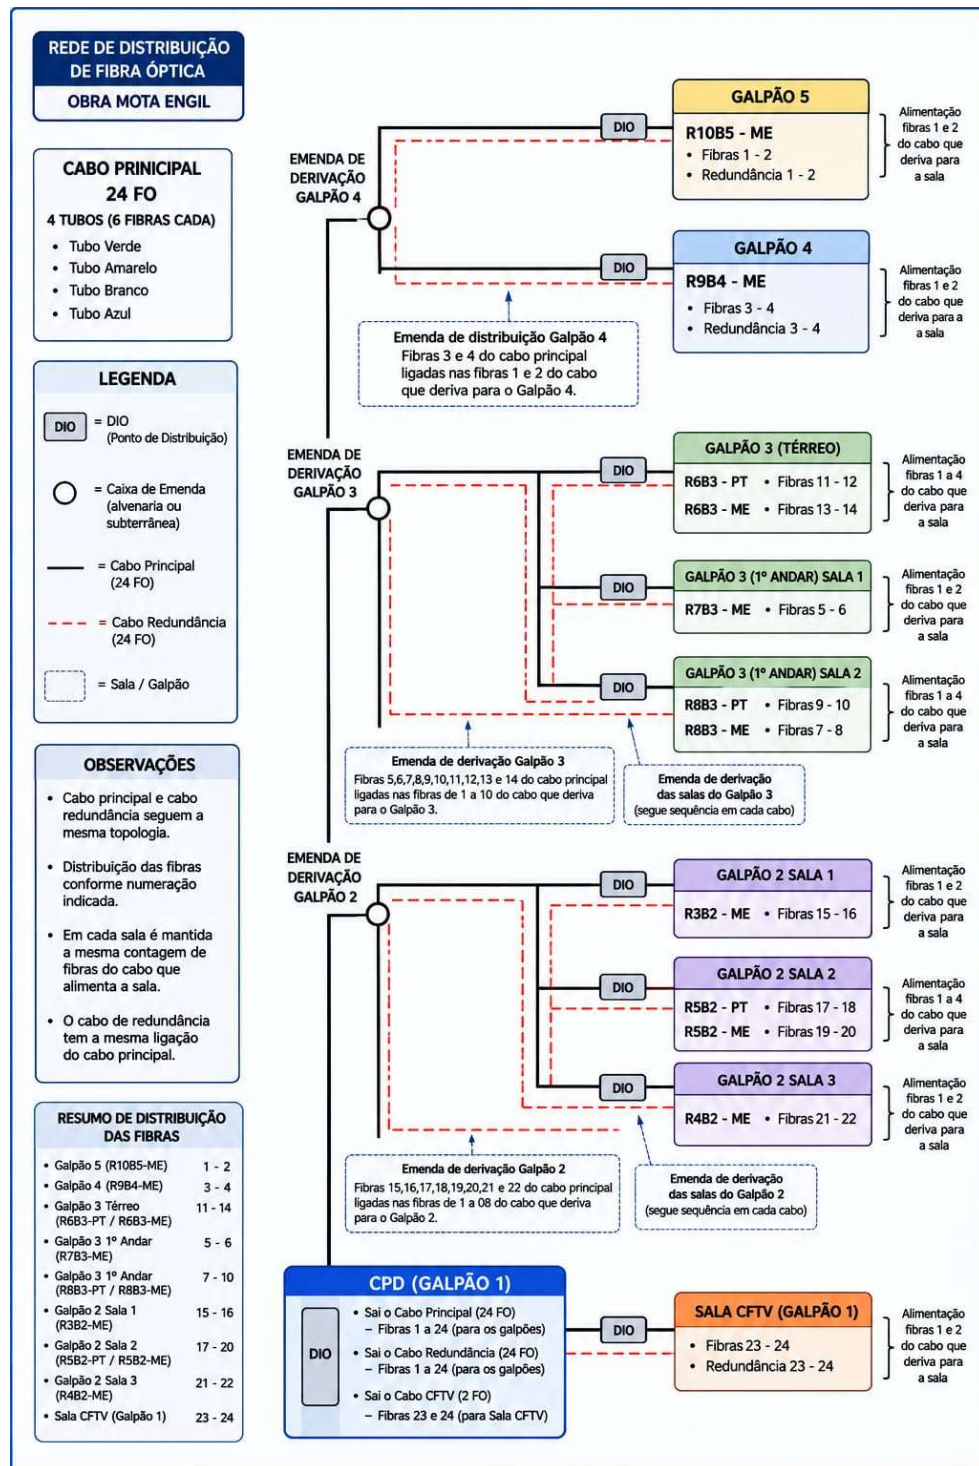

7. Encerramento e Assinaturas

Com a finalização das etapas operacionais, o projeto de cabeamento estruturado em fibra óptica foi concluído com sucesso. A arquitetura implementada seguiu a topologia em estrela, interligando de forma centralizada os 5 (cinco) galpões operacionais e o prédio administrativo. Toda a infraestrutura converge diretamente para o Data Center (CPD) localizado no bloco administrativo, totalizando a entrega de 46 pontos de fibra óptica ativos e testados.

Visando a alta disponibilidade do ambiente, o escopo contemplou o lançamento de fibra de redundância para garantir o failover dos ativos. Como única ressalva técnica do projeto — e conforme previamente alinhado e validado com o gestor Marlon —, houve uma limitação física na infraestrutura da sala de CFTV que impossibilitou a passagem do cabo de redundância neste setor específico. Sendo assim, o ambiente do CFTV foi entregue operando estritamente com os 2 (dois) pontos da fibra principal, mantendo a estabilidade e a conectividade planejadas para o setor.

Responsável Técnico Tracevia
Everton Narciso

Responsável Técnico Mota Engil
Marlon Souza Cardoso
